

【牡鹿海岸清水田地区海岸】進捗状況


事業概要

復旧延長 L=685m


捨石工40,039m³、堤体コンクリート14,646m³、根固工2,747個

裏法被覆工4,791m²、樋管工2基、樋門工1基

計画平面図

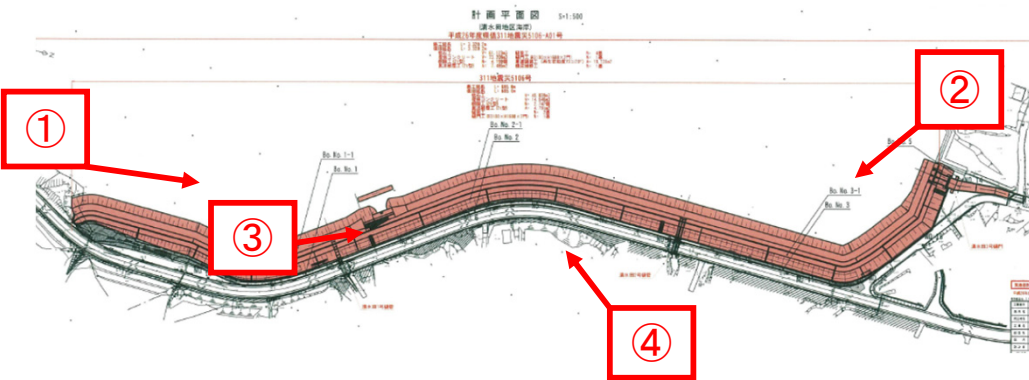

計画横断図

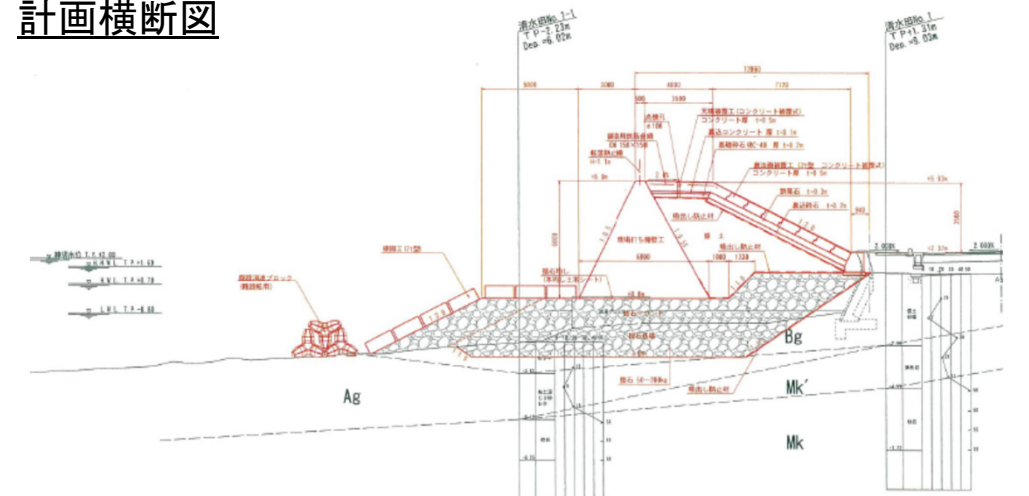

事業位置



牡鹿海岸清水田地区海岸
石巻市 清水田浜地先

① 着手前 平成26年9月



② 着手前 平成26年9月



【牡鹿海岸清水田地区海岸】進捗状況

進捗状況

令和2年6月に防潮堤・樋門が完成しました。

① 令和2年8月末現在の状況

始点側



裏法被覆工が完成しました。

② 令和2年8月末現在の状況

終点側



取付水路が完成しました。

③ 令和2年8月末現在の状況



天端被覆工が完成しました。

④ 令和2年8月末現在の状況



天端被覆工が完成しました。
